

4

Neugestaltung Knoten
inkl. Neuordnung Parkplätze und Schulhauszugang

Schulstrasse / Poststrasse

Situation 1:200

Plan ausgeführtes Werk

Projektverfasser Planung · Vermessung · Geoinformatik · Tiefbau



Ingenieur- und Vermessungsbüro

Strehlgasse 21
8472 Seuzach

Telefon 052 320 03 20
info@leisinger.ch

Plan Nr.: 1




Projekt Nr.: 10/03/023

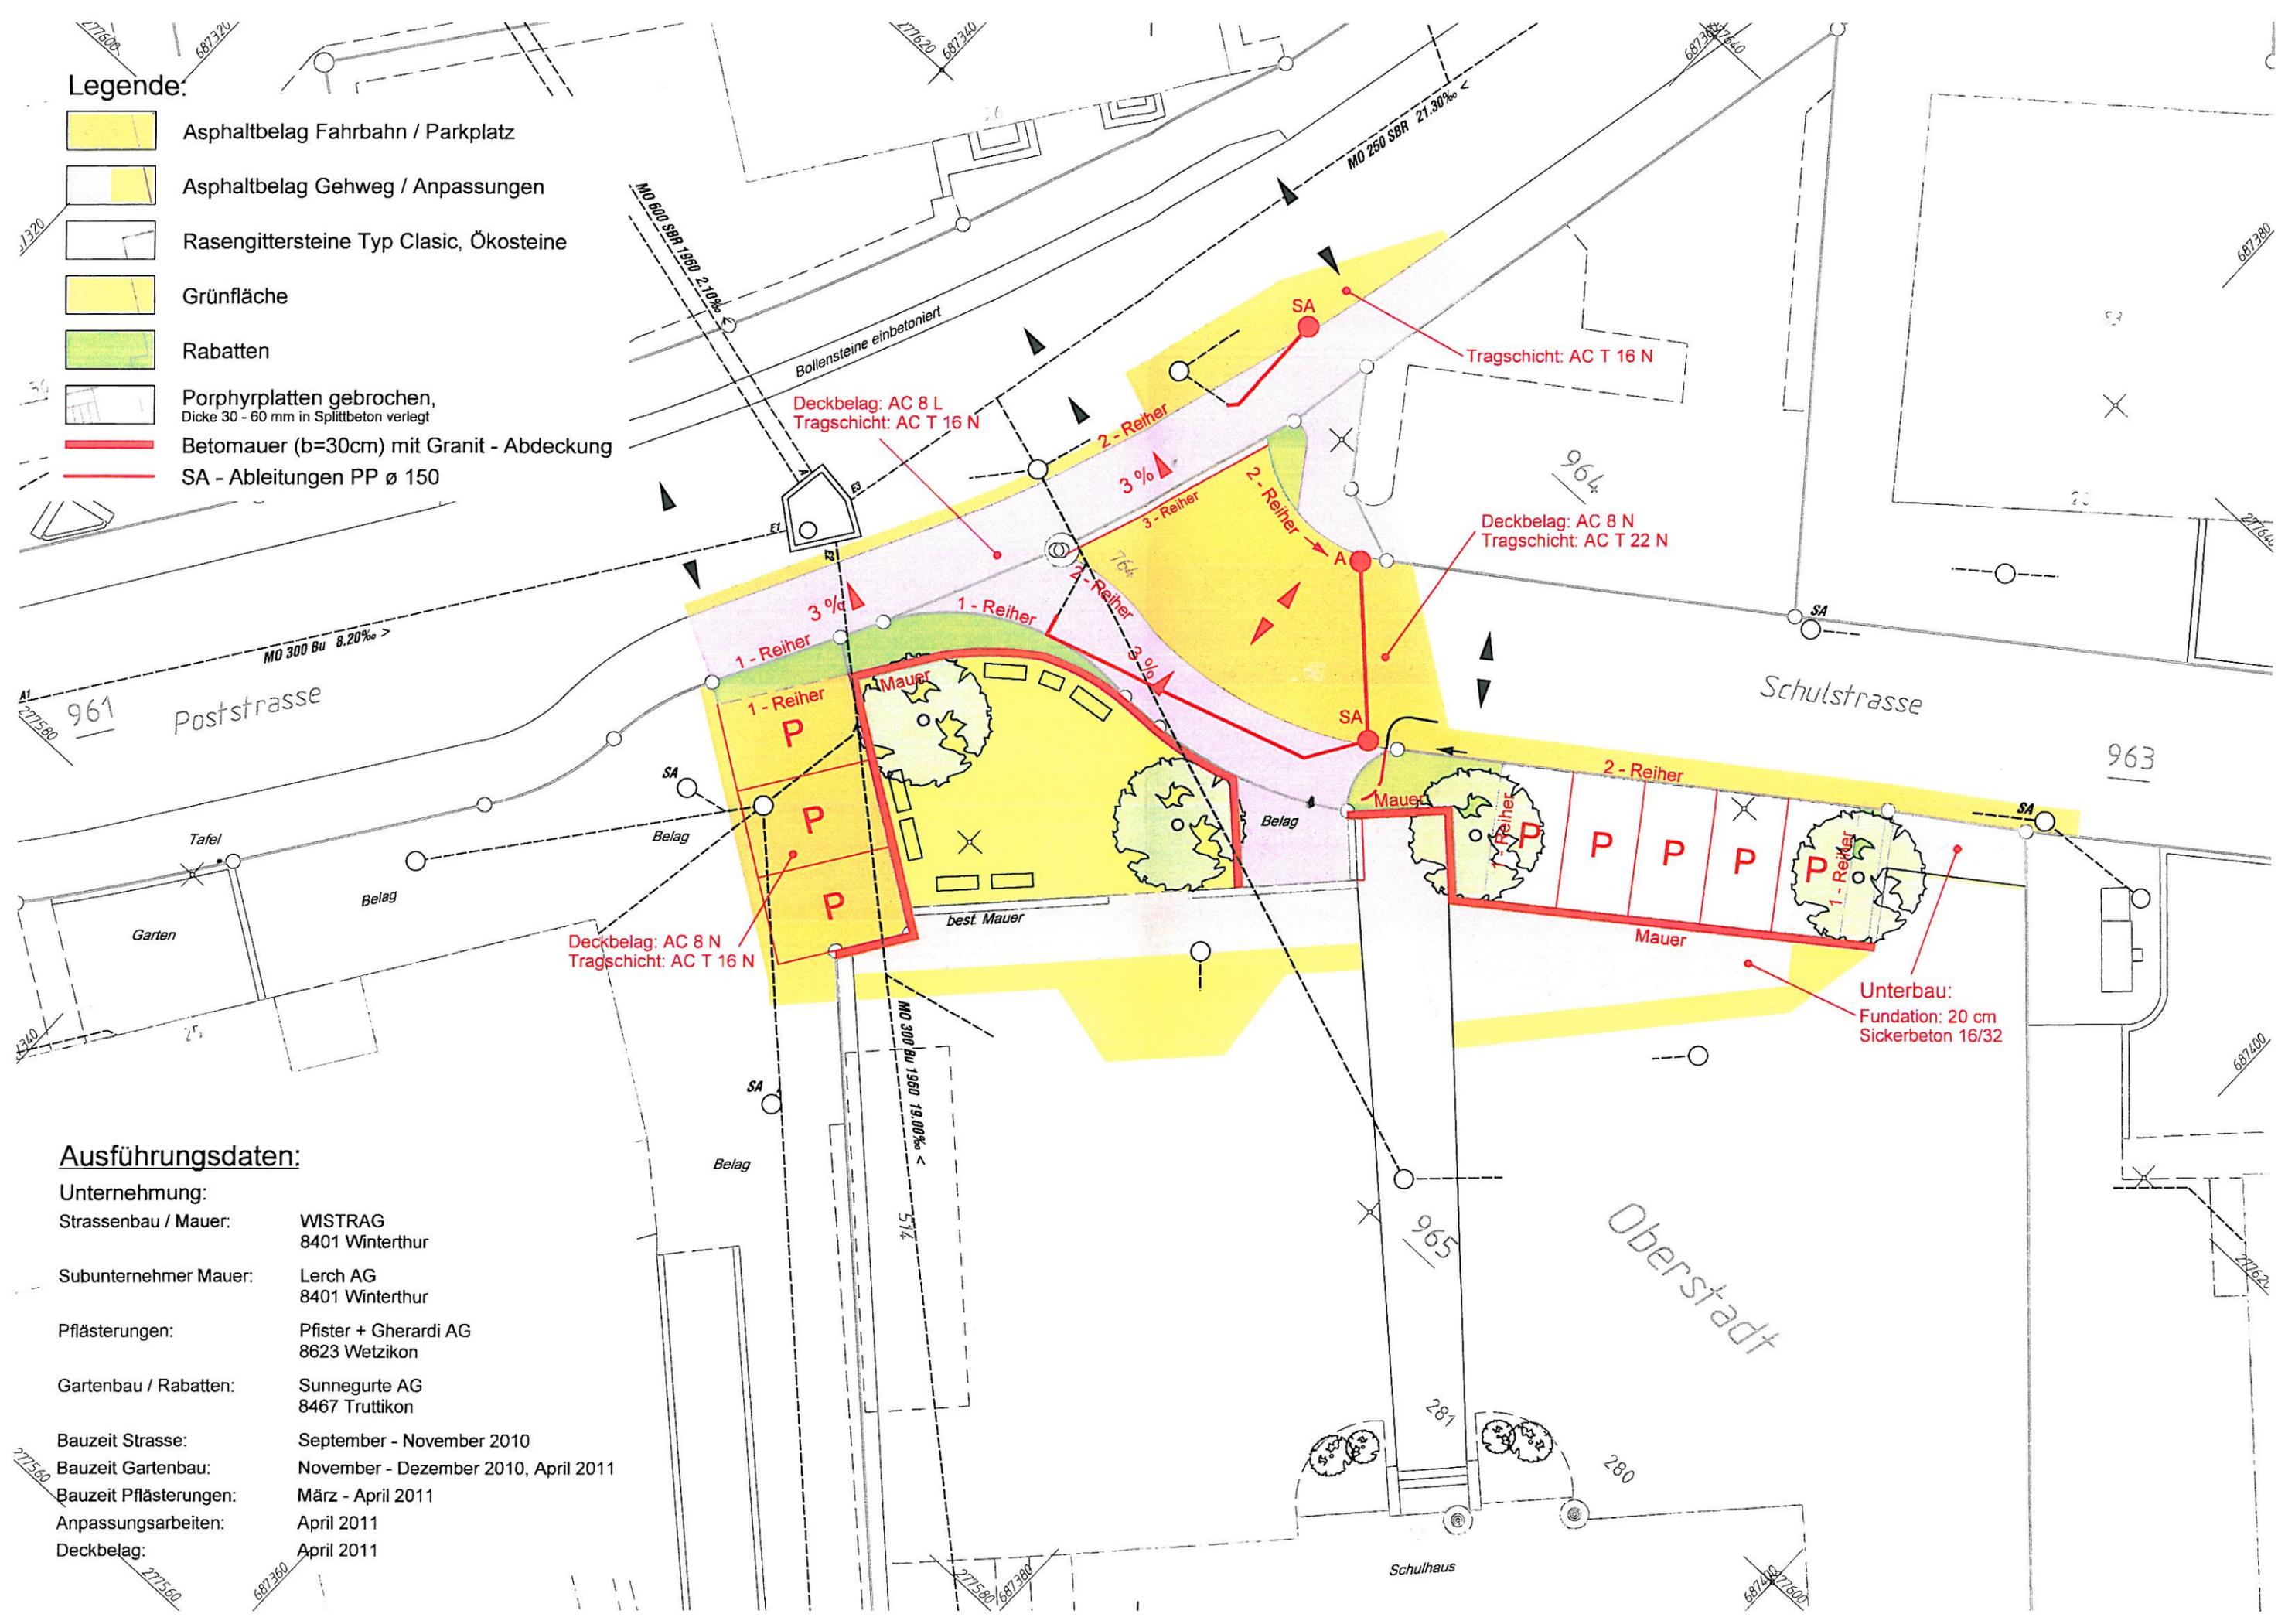
Format: 30 x 63

Datum	Gez.	Kontr.	Freigabe
Dezember 2011	Lue	PSch	

Nachführungen

Legende:

-  Asphaltbelag Fahrbahn / Parkplatz
-  Asphaltbelag Gehweg / Anpassungen
-  Rasengittersteine Typ Clasic, Ökosteine
-  Grünfläche
-  Rabatten
-  Porphyrplatten gebrochen, Dicke 30 - 60 mm in Splittbeton verlegt
-  Betomauer (b=30cm) mit Granit - Abdeckung
-  SA - Ableitungen PP ø 150



Ausführungsdaten:

- Unternehmung:**
- Strassenbau / Mauer: WISTRAG
8401 Winterthur
- Subunternehmer Mauer: Lerch AG
8401 Winterthur
- Pflästerungen: Pfister + Gherardi AG
8623 Wetzikon
- Gartenbau / Rabatten: Sunnegurte AG
8467 Truttikon
- Bauzeit Strasse: September - November 2010
- Bauzeit Gartenbau: November - Dezember 2010, April 2011
- Bauzeit Pflästerungen: März - April 2011
- Anpassungsarbeiten: April 2011
- Deckbelag: April 2011
